

Projet: JungleBeasts

Suivi de projet - Avancement et Méthodes organisationnelles

Composition et présentation de Jungle

► COMPOSITION DE L'EQUIPE :

Nelly LASSEGUE >>> Graphiste

Mohamed ALAMI >>> Développeur BACK

► Hakim MAKHTOUR >>> Développeur BACK

Aude PONS >>> Développeur FRONT

RAPPEL DU PROJET :

Création d'une banque d'images orientée réseau social. Le but est de pouvoir exposer et trouver des ressources dans le domaine de l'imagerie.

OUTILS COLLABORATIFS UTILISES :

► Google Drive >>> Partage de fichiers


Slack >>> Partage de fichiers et communication

Trello >>> Gestion organisationnelle du projet

Excel >>> Gestion organisationnelle du projet

Trello: Un outil de gestion de projet

- Pour organiser le projet, nous avons opté pour des étiquettes de couleurs et des préfixes (cf : Légende).
- La liste backlog (cf : A faire) est constituée de toutes les tâches du projet.
- ► La liste du sprint en cours (cf : Sprint 2 - 06/02 - 14/02) contient toutes les tâches issues de la backlog.
- Une tâche est terminée quand :
 - ► BACK : La fonctionnalité est opérationnelle.
 - ► FRONT : Les maquettes et le design HTML / CSS ont été réalisés (checklist cochée).
 - ► CO : Le BACK et le FRONT ont été assemblés.

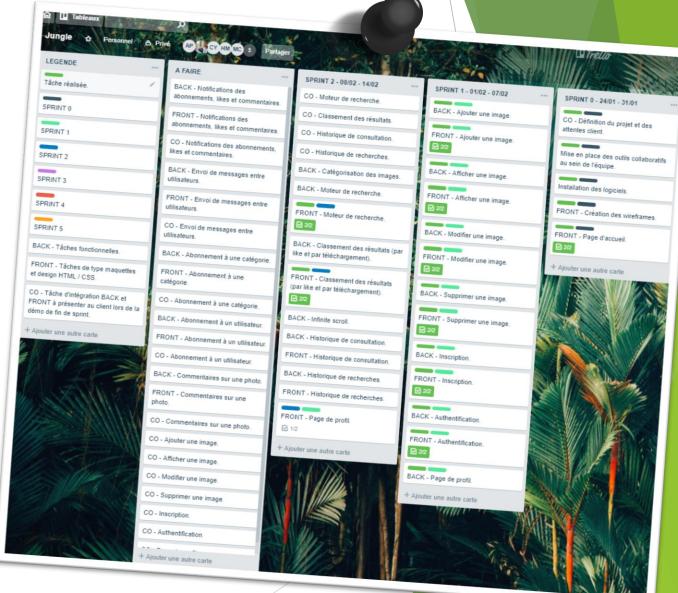

Excel: Un outil de gestion de projet

- Excel nous a permis lors du sprint 0 d'effectuer un planning global.
- Nous réévaluons ce planning à chaque fin de sprint. Pour se faire, nous repriorisons avec notre PO les tâches.
- Ce tableau global nous permet d'utiliser correctement notre outil Trello.



Avancement du projet

	GLOBAL	BACK	FRONT	СО
GLOBAL	55	18	18	17
REALISE	21	7	11	1
NON REALISE	34	11	7	16
% AVANCEMENT	38	38	61	5,88

- Nous avons au total 55 tâches à réaliser (comprenant le back (18), le front(18) et la co(17)).
- Au niveau global, le projet est avancé à 38%.
- Au niveau BACK, le projet est avancé à 38%.
- Au niveau FRONT, le projet est avancé à 61%.
- Au niveau intégration BACK & FRONT, le projet est avancé à 5,88%.
- Concernant la date d'atterissage de notre backlog ce sera le vendredi 03 mars 2019. En effet, nous sommes actuellement encore dans le sprint 2. De plus, il nous reste encore 3 sprint pour mener à bien ce projet.
